

測定場所：富士中学校

住所：七左町二丁目85番地

測定日時：平成25年2月25日（月曜）委託業者測定


平成25年2月25日（月曜）再測定

13時25分～13時30分

平成25年3月26日（火曜）除染

9時50分～11時30分

天気：2月25日（晴れ）、3月26日（晴れ）

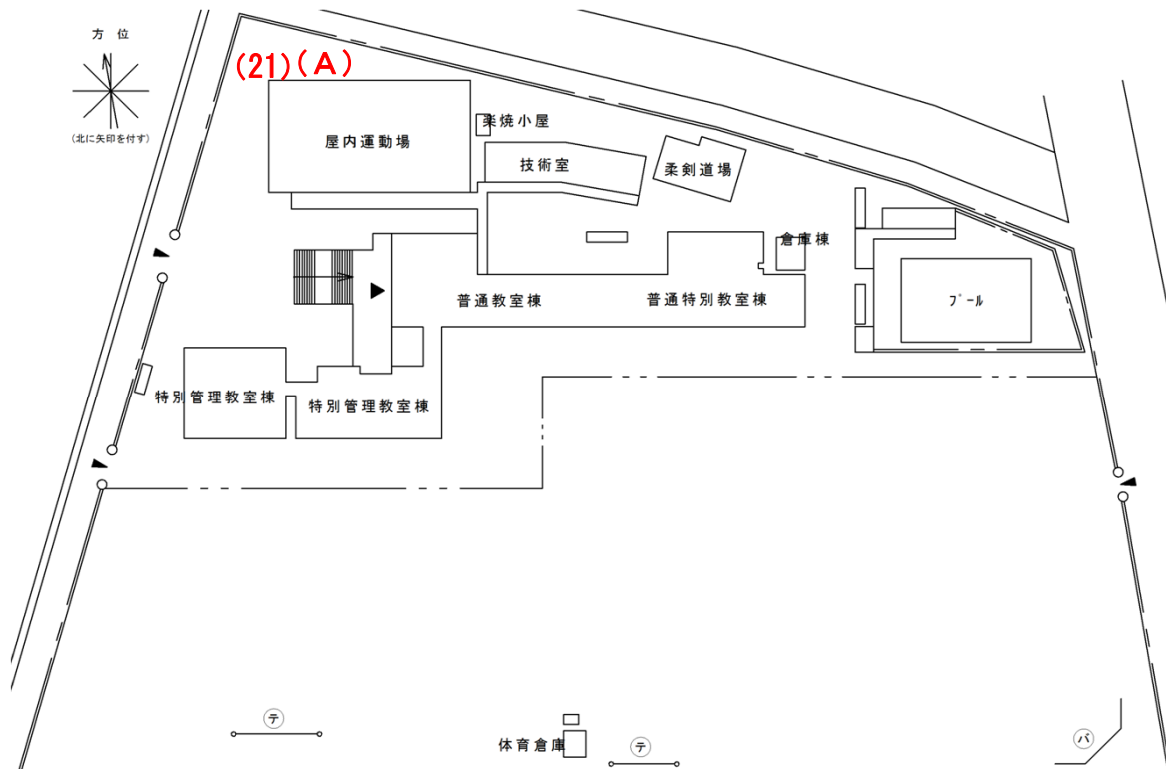

●委託業者測定値

| 測定地点       | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|------------|--------------------------|--------|------|
|            | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (21) 排水溝残土 | 1.93                     | 0.38   | 0.27 |

●再測定

| 測定地点       | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|------------|--------------------------|--------|------|
|            | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (21) 排水溝残土 | 2.01                     | 0.40   | 0.30 |

除染作業前再測定

| 測定地点       | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|------------|--------------------------|--------|------|
|            | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (21) 排水溝残土 | 2.04                     | 0.41   | 0.30 |
| (A) 埋設場所   | 0.10                     | 0.11   | 0.10 |

除染作業後測定

| 測定地点       | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|------------|--------------------------|--------|------|
|            | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (21) 排水溝残土 | 0.17                     | 0.17   | 0.16 |
| (A) 埋設場所   | 0.09                     | 0.10   | 0.09 |

・ 除染作業内容

2/25 (21)再測定、除染範囲を確認。

3/26 (21)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 土砂等の除去範囲

(21) 排水溝残土 : 深さ30cm、長さ200cm、幅200cm

・ 埋設場所範囲

深さ100cm、長さ200cm、幅100cm
