

測定場所：蒲生第二小学校

住所：蒲生旭町1番75号

測定日時：平成25年3月5日（火曜）委託業者測定


平成25年3月5日（火曜）再測定

16時50分～16時55分

平成25年3月26日（火曜）除染

9時00分～9時20分

天気：5日（晴れ）、26日（晴れ）

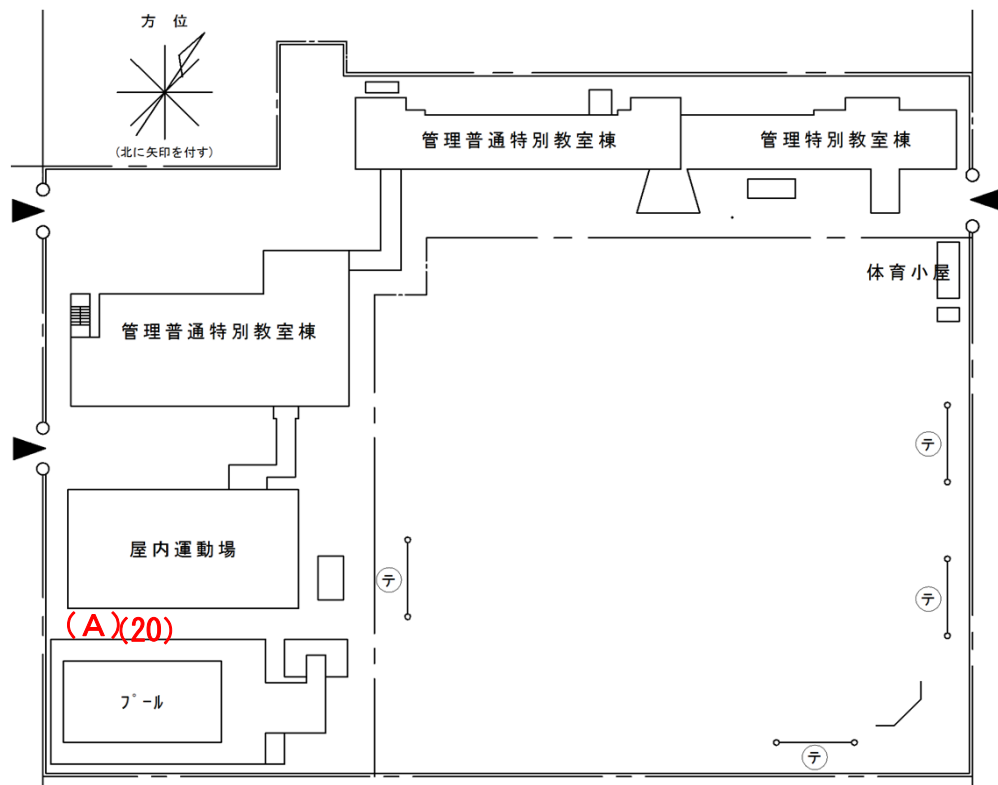

●委託業者測定値

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(20) 排水溝残土	1.74	0.31	0.15

●再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(20) 排水溝残土	1.76	0.38	0.18

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(20) 排水溝残土	1.78	0.39	0.19
(A) 埋設場所	0.11	0.10	0.09

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(20) 排水溝残土	0.19	0.15	0.11
(A) 埋設場所	0.11	0.11	0.09

・ 除染作業内容

3/5 (20) 再測定、除染範囲を確認。

3/26 (20) 周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 土砂等の除去範囲

(20) 排水溝残土 : 深さ20cm、長さ50cm、幅30cm

・ 埋設場所範囲

深さ60cm、長さ100cm、幅100cm
