

測定場所：越ヶ谷小学校


住所：中町1番41号

測定日時：平成24年12月18日(火曜) 委託業者測定

平成24年12月18日(火曜) 再測定 16時10分 ～ 16時15分

平成24年12月25日(火曜) 除染 9時00分 ～ 14時20分

天気：18日(晴れ)、25日(晴れ)

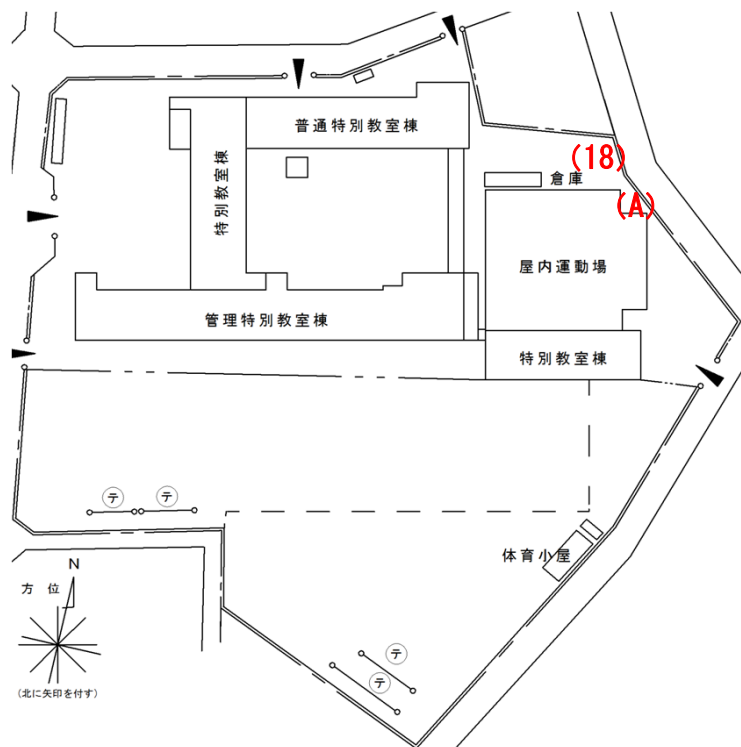

委託業者測定値

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(18) 排水溝残土	0.42	0.23	0.15

再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(18) 排水溝残土	0.43	0.25	0.16

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(18) 排水溝残土	0.41	0.24	0.17
(A) 埋設場所	0.09	0.08	0.08

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(18) 排水溝残土	0.18	0.14	0.12
(A) 埋設場所	0.09	0.08	0.07

・ 除染作業内容

12/18 (18)再測定、除染範囲を確認。

12/25 (18)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 土砂等の除去範囲

(18) 排水溝残土 : 深さ30cm、長さ1400cm、幅100cm

・ 埋設場所範囲

深さ70cm、長さ225cm、幅170cm
