

測定場所：南中学校


住所：川柳町一丁目198番地

測定日時：平成24年10月3日（水曜）委託業者測定

平成24年10月3日（水曜）再測定 13時55分～14時05分

平成24年10月5日（金曜）除染 9時00分～10時30分

天気：3日（曇り）、5日（晴れ）

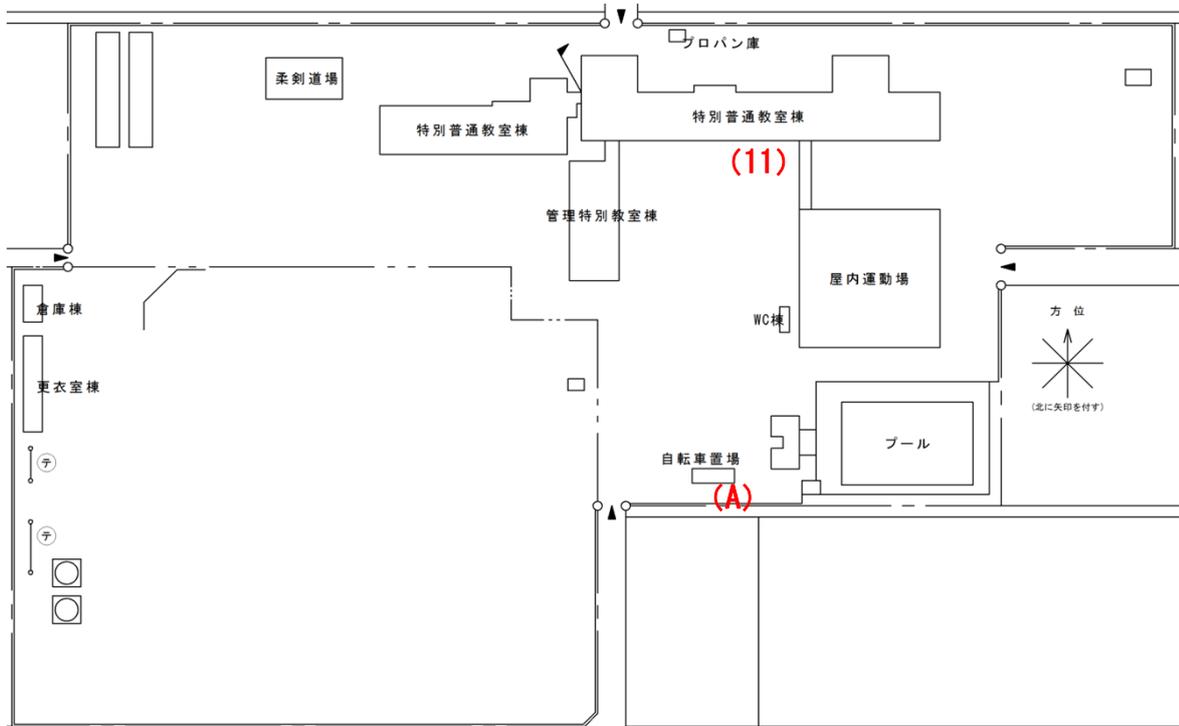

委託業者測定値

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (11) 雨樋 1 1 校舎 | 1.08 | 0.12 | 0.11 |

再測定

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (11) 雨樋 1 1 校舎 | 1.16 | 0.13 | 0.10 |

除染作業前再測定

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (11) 雨樋 1 1 校舎 | 0.63 | 0.14 | 0.10 |
| (A) 埋設場所 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |

除染作業後測定

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (11) 雨樋 1 1 校舎 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| (A) 埋設場所 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |

・ 除染作業内容

10/3 (11)再測定、除染範囲を確認。

10/5 (11)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 除去土砂等の量：土のう袋 1 袋分

・ 埋設場所範囲

深さ 200cm、長さ 100cm、幅 50cm
