

測定場所：大間野小学校


住所：大間野町二丁目115番地

測定日時：平成24年10月17日（水曜）委託業者測定

平成24年10月17日（水曜）再測定 15時10分～15時30分

平成24年10月24日（水曜）除染 9時10分～11時10分

天気：17日（曇り）、24日（晴れ）

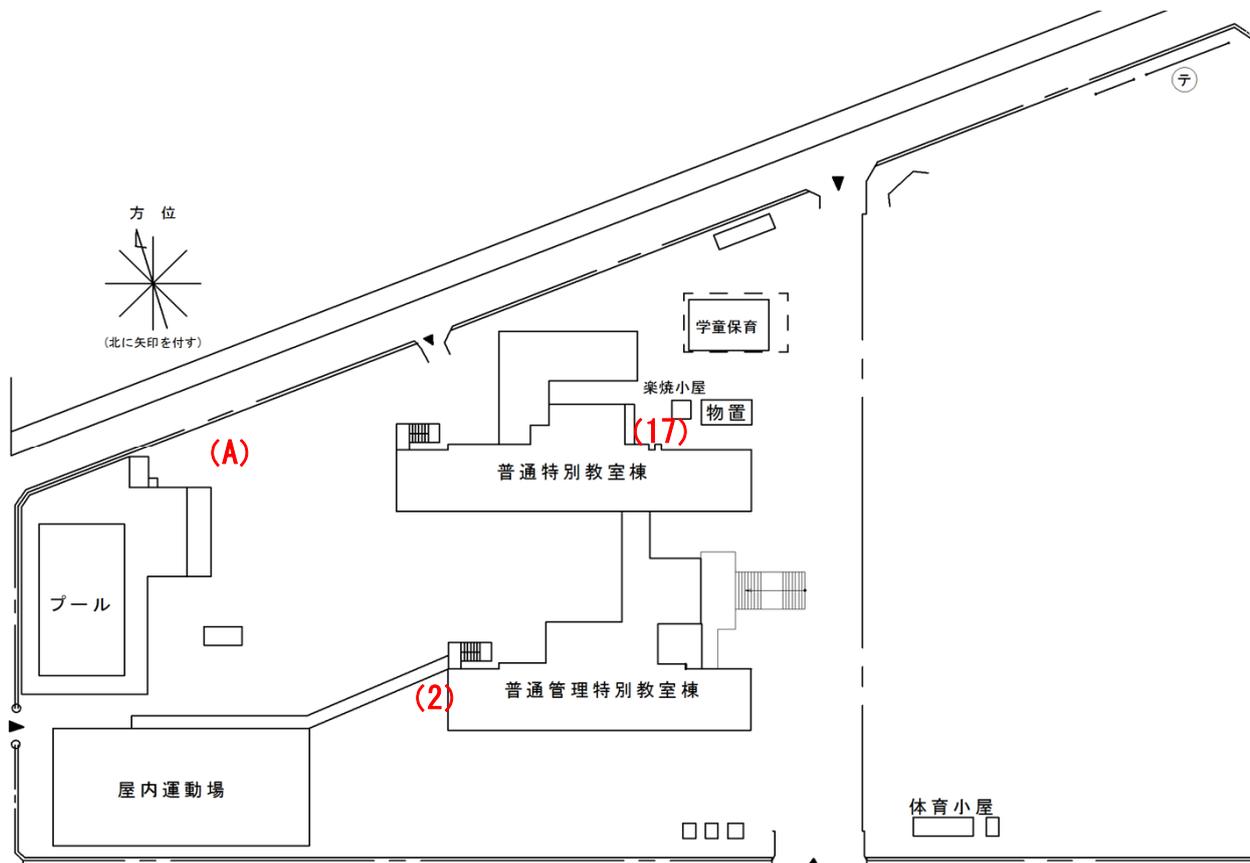

### 委託業者測定値

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) U字溝	0.59	0.20	0.13
(2) 雨樋2 校舎	0.54	0.21	0.13

### 再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) U字溝	0.65	0.25	0.12
(2) 雨樋2 校舎	0.50	0.24	0.13

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) U字溝	0.70	0.26	0.12
(2) 雨樋2 校舎	0.48	0.27	0.15
(A) 埋設場所	0.10	0.09	0.07

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) U字溝	0.17	0.12	0.11
(2) 雨樋2 校舎	0.16	0.11	0.09
(A) 埋設場所	0.07	0.08	0.08

・ 除染作業内容

10/17 (17)、(2)再測定、除染範囲を確認。

10/24 (17)、(2)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 土砂等の除去範囲

(17) U字溝 : 深さ10cm、長さ50cm、幅20cm  
 (2) 雨樋2 校舎 : 深さ30cm、長さ100cm、幅30cm

・ 埋設場所範囲

深さ70cm、長さ120cm、幅120cm
