

測定場所：大相模中学校


住所：相模町三丁目165番地

測定日時：平成24年9月26日（水曜）委託業者測定

平成24年9月26日（水曜）再測定 11時45分～12時00分

平成24年10月3日（水曜）除染 9時00分～16時00分

天気：9月26日（晴れ）、10月3日（曇り）

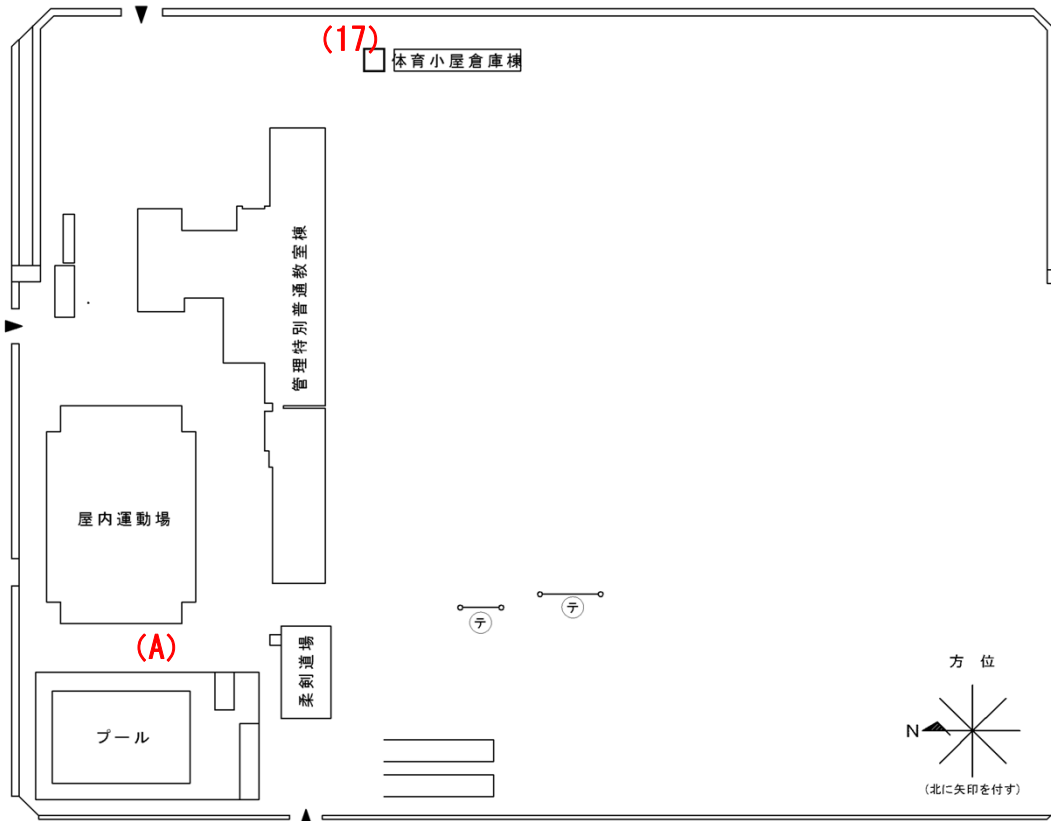

委託業者測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) 排水溝残土	1.53	0.57	0.35

再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) 排水溝残土	1.25	0.54	0.33

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) 排水溝残土	1.14	0.51	0.37
(A) 埋設場所	0.08	0.08	0.07

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(17) 排水溝残土	0.14	0.13	0.14
(A) 埋設場所	0.09	0.09	0.07

・ 除染作業内容

9/26 (17)再測定、除染範囲を確認。

10/3 (17)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 除去土砂等の量：土のう袋63袋分

・ 埋設場所範囲

深さ70cm、長さ620cm、幅165cm
