

測定場所：大相模中学校


住所：相模町三丁目165番地

測定日時：平成25年1月23日（水曜）委託業者測定

平成25年1月23日（水曜）再測定 13時20分～13時25分

平成25年2月1日（金曜）除染 9時00分～14時30分

天気：1月23日（晴れ）、2月1日（晴れ）

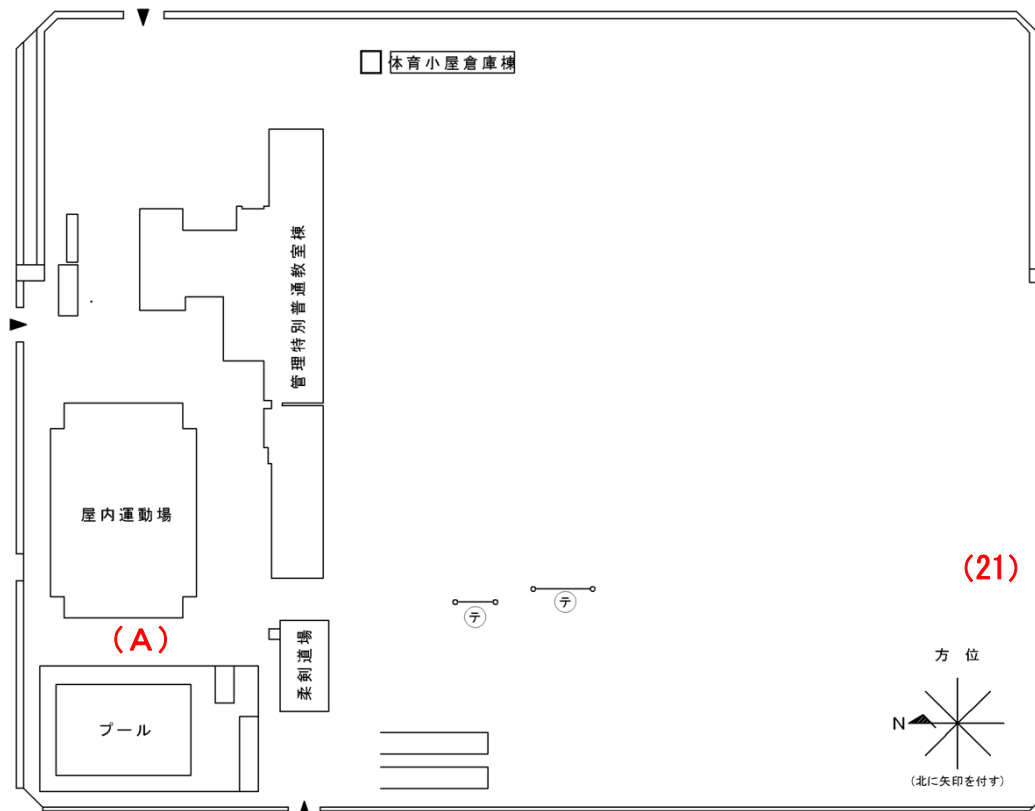

委託業者測定値

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(21) 校庭清掃時残土	0.50	0.30	0.22

再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(21) 校庭清掃時残土	0.53	0.32	0.20

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(21) 校庭清掃時残土	0.51	0.32	0.20
(A) 埋設場所	0.09	0.09	0.08

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(21) 校庭清掃時残土	0.20	0.17	0.16
(A) 埋設場所	0.07	0.05	0.07

・ 除染作業内容

1/23 (21)再測定、除染範囲を確認。

2/1 (21)周辺の土砂を除去。

埋設場所に、除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め、遮水シートに包み埋設。

・ 土砂等の除去範囲

(21) 校庭清掃時残土 : 深さ20cm、長さ300cm、幅150cm

・ 埋設場所範囲

深さ74cm、長さ350cm、幅70cm
